



# KENDO MANAGER


SOFTVER ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

<https://www.kendomanager.com/>

# KENDO MANAGER

Project Server za upravljanje portfolimo projekata

- Tradicionalni projektni menadžment
- Agilni projektni menadžment
- Scrum
- Upravljanje projektima prema PMI
- EU projekti - PCM metodologija

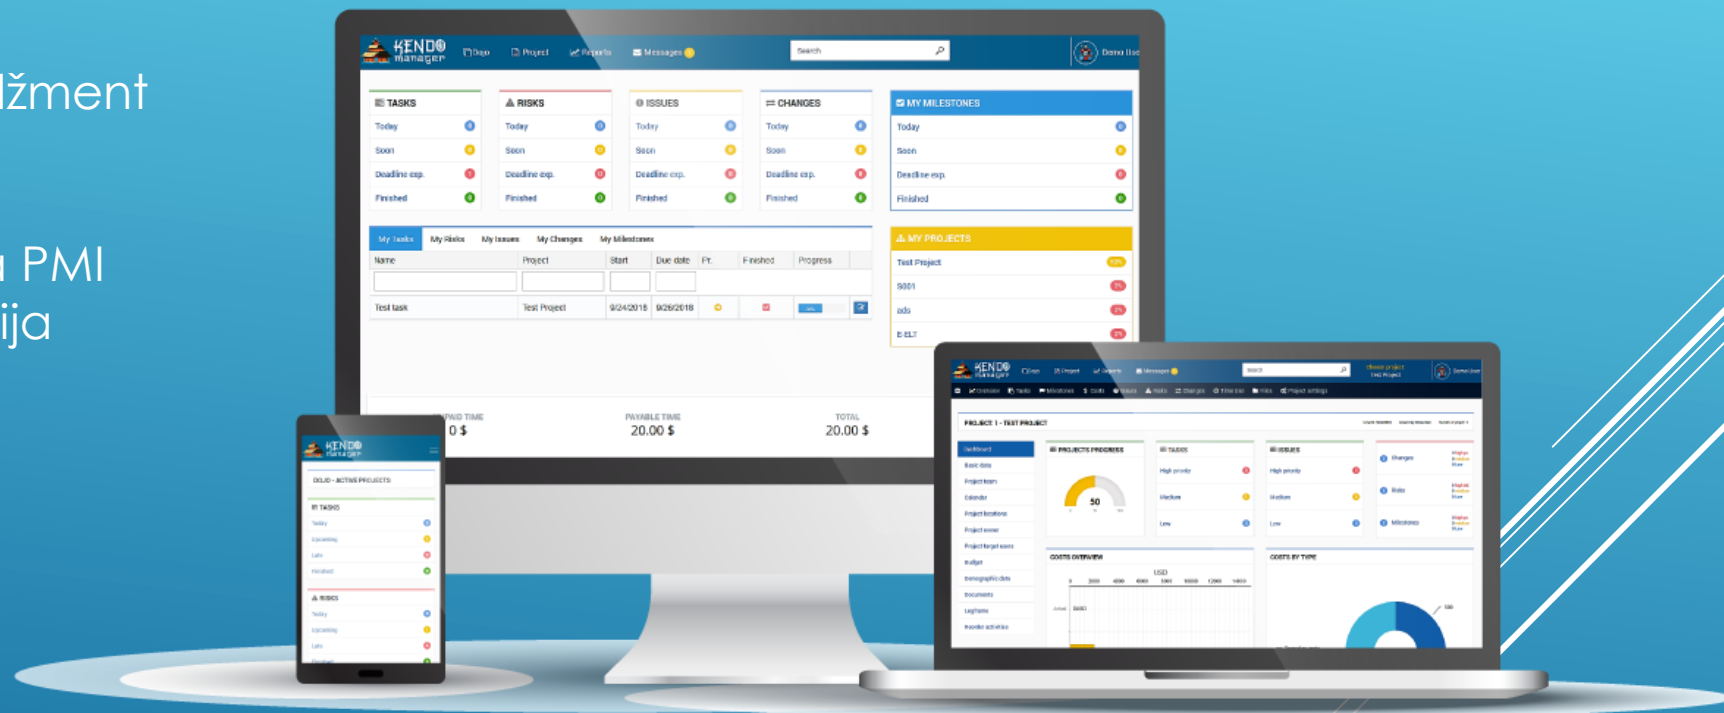

# Types of projects


- Ekonomski projekti
- Građevinski projekti
- Javni projekti
- Marketing projekti
- Softverski projekti
- EU projekti
- PCM metodologija
- IPA projekti
- Ostali projekti



# Kendo Manager Opcije



- Kontrolne table u realnom vremenu(project dashboard, my dashboard, Dojo Multiple Project Dashboard)
- Upravljanje aktivnostima na projektu
- Gantt Chart
- Kanban
- Lista aktivnosti (WBS)
- Budžet Menadžment
- Upravljanje resursima na projektu
- Dokument Menadžment
- Upravljanjem vremenom na projektu
- Upravljanje rizikom
- Praćenje problema na projektu
- Upravljanje promjenama
- Saradnja i komunikacija na projektu
- Reporting (Advanced Reports)
- Kolaboracija na projektima
- Email i sistemska obavještenja
- Multijezičnost (Srpski, Hrvatski, Bosanski, Engleski, Njemački i Španski jezik)
- Role i dozvole
- Self-Hosted/ Server za upravljanje portfoliom projekta
- Ostale opcije(Lokacija projekta,vlasnik projekta,ciljana grupa projekta, Demografski podaci, Logička matrica)
- ...

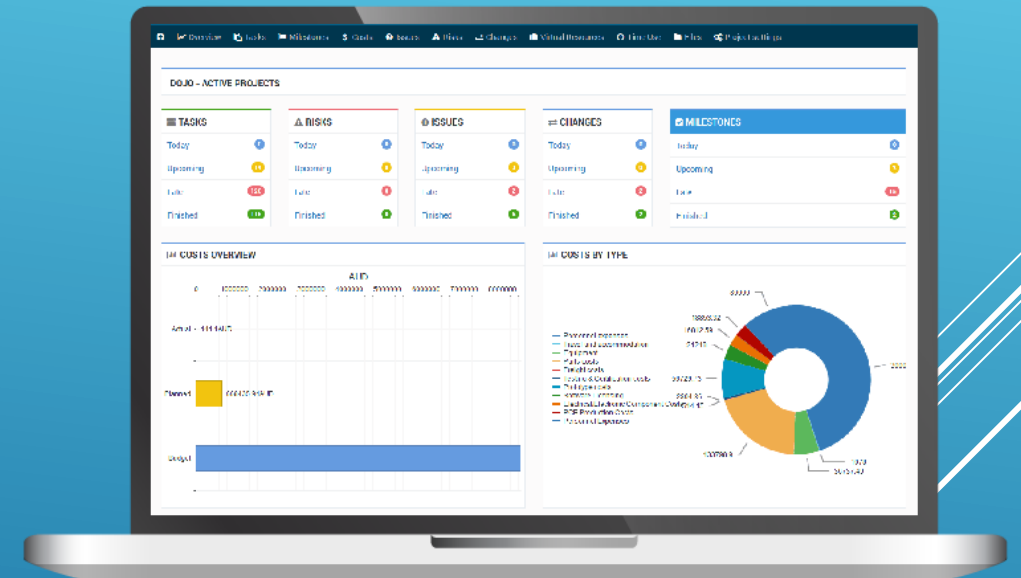

# Tehnički Detalji

## Deployment

- Lokalni server
- Online server/Cloud
- Windows 10 PC, Windows VPS, Asp Net Hosting

## Sistemski Zahtjevi

Minimalna tehnička konfiguracije:

- Min: Intel Dual-Core Processor
- RAM: Preporuka 2 GB or more
- Windows VPS, MS Windows 10, MS Windows Server 2008, 2012, 2016 or Asp Net Hosting.
- MariaDB 10.1.20 + or MySQL(contact us)
- IIS 7.0, 8.0, 10.0, .NET Framework 4 +




# Princip rada

1. Registracija korisnika u aplikaciji
2. Kreiranje projekta
3. Kreiranje liste aktivnosti (taskova)
4. Definisanje trajanja aktivnosti (start and end)
5. Definisanje resursa na projektu
6. Delegiranje procesa članu projektnog tima koji je odgovoran za njegovu realizaciju
7. Komunikacija - Diskusija, Komentari i Automatska email i sistemska obavještenja
8. Monitoring u realnom vremenu – Kontrolne table projekta, Moja kontrolna tabla, Project overview, Dojo portfolio kontrolna tabla
9. Izvještaji



# Kreiranje korisnika u Kendo Manageru


- Korisničke role
- Predefinisana prava
- Projekt Menadžer – Osnovna rola- Korisnik
- Eksterni Član tima – Gost rola- Gost Nalog
- Druge predefinisane role: Član Tim, Tim lider, Software Tester
- Mogućnost kreiranja novih rola

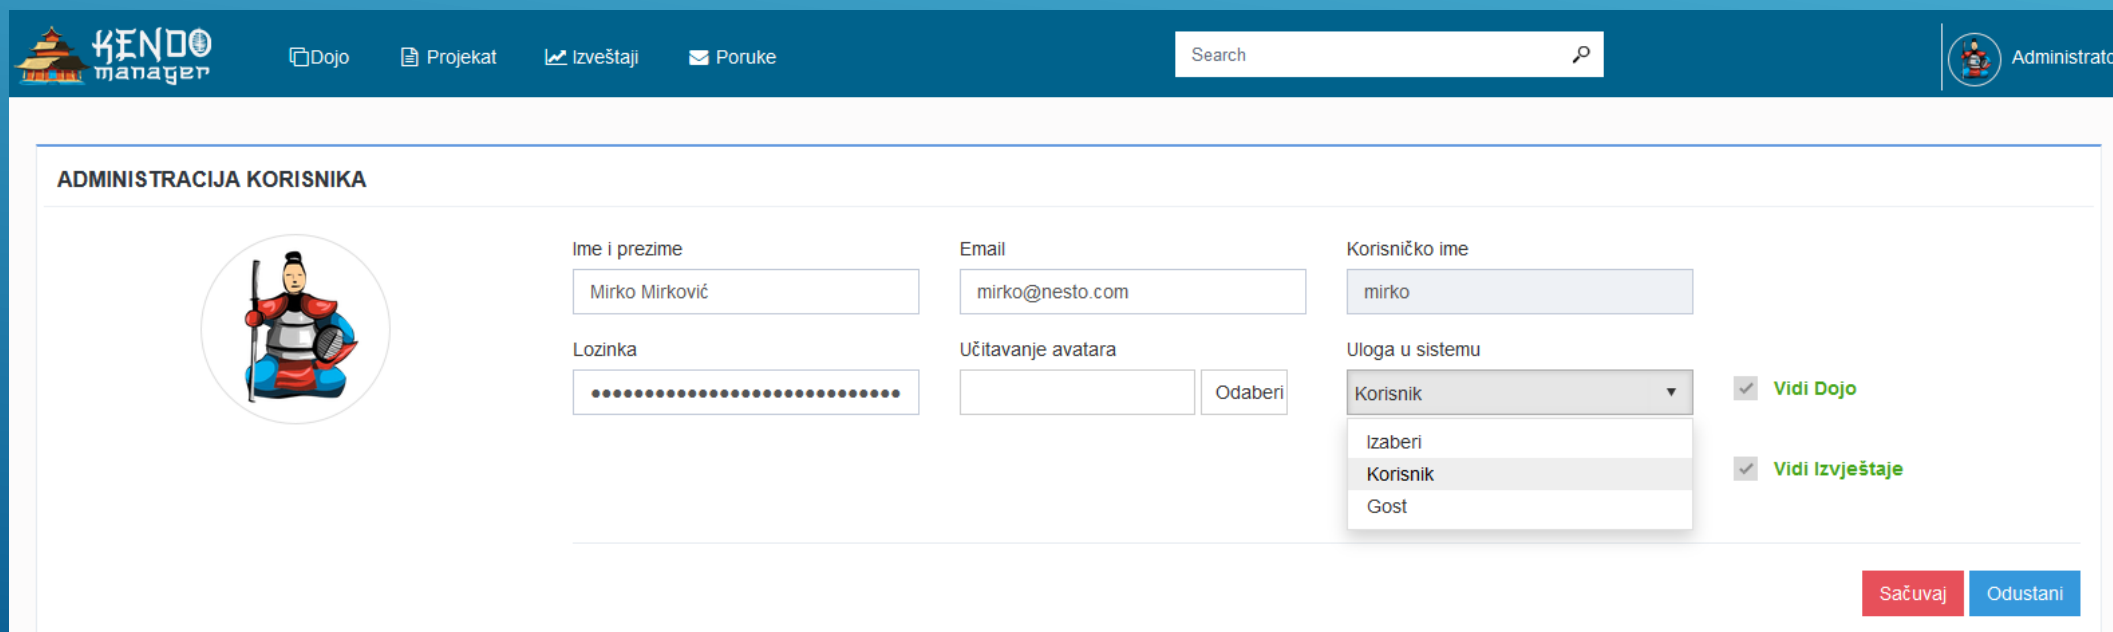

The screenshot shows the 'ADMINISTRACIJA KORISNIKA' (User Administration) page in Kendo Manager. The interface includes a top navigation bar with the Kendo Manager logo, menu items for Dojo, Projekat, Izveštaji, and Poruke, a search bar, and a user profile indicator for 'Administrator'. The main content area features a user profile card for 'Mirko Mirković' with a kendo avatar. The form fields include: 'Ime i prezime' (Mirko Mirković), 'Email' (mirko@nesto.com), 'Korisničko ime' (mirko), 'Lozinka' (masked with dots), 'Učitavanje avatara' (upload button), and 'Uloga u sistemu' (role dropdown menu). The role dropdown is open, showing options: 'Korisnik', 'Izaberi', 'Korisnik', and 'Gost'. To the right of the role dropdown, there are two checked checkboxes: 'Vidi Dojo' and 'Vidi Izveštaje'. At the bottom right, there are 'Sačuvaj' (Save) and 'Odustani' (Cancel) buttons.

# Kreiranje projekta

- Osnovni podaci o projektu
- Definisane projektnog tima
- Projektna dokumentacija
- Budžet projekta
- Druge opcije

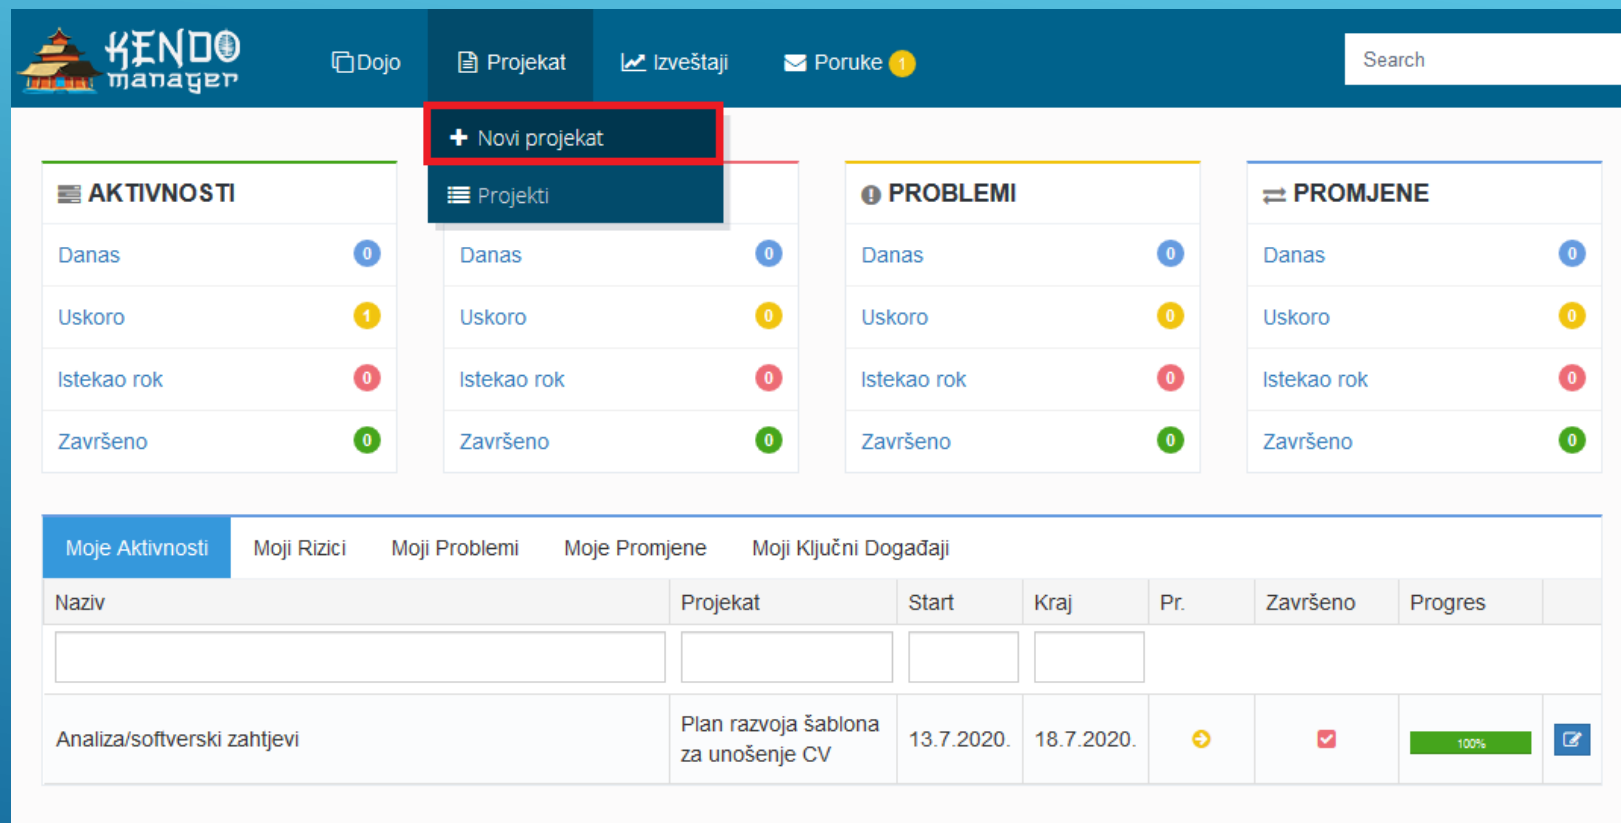

The screenshot shows the KENDO manager dashboard. The top navigation bar includes 'Dojo', 'Projekat', 'Izveštaji', and 'Poruke' (with a notification badge). A search bar is on the right. The main content area is divided into four panels: 'AKTIVNOSTI', 'Projekti', 'PROBLEMI', and 'PROMJENE'. Each panel shows a summary for 'Danas', 'Uskoro', 'Istekao rok', and 'Završeno'. The 'Projekti' panel has a '+ Novi projekat' button highlighted with a red box. Below these panels is a table with tabs for 'Moje Aktivnosti', 'Moji Rizici', 'Moji Problemi', 'Moje Promjene', and 'Moji Ključni Događaji'. The table has columns for 'Naziv', 'Projekat', 'Start', 'Kraj', 'Pr.', 'Završeno', and 'Progres'.

Naziv	Projekat	Start	Kraj	Pr.	Završeno	Progres
Analiza/softwareški zahtjevi	Plan razvoja šablona za unošenje CV	13.7.2020.	18.7.2020.	→	✓	100%





- Dashboard
- Osnovni podaci
- Projektni tim
- Kalendar
- Lokacija projekta
- Vlasnik projekta
- Korisnici projekta
- Budžet
- Demografski podaci
- Dokumenti
- Logička matrica
- Presložite aktivnosti





### AKTIVNOSTI

Visokog prioriteta	2
Srednji	2
Nizak	0

### PROBLEMI

Visokog prioriteta	1
Srednji	0
Nizak	0

Promjene	0 visok pr. 0 srednji 0 nizak
rizik(a)	0 visok ut. 0 srednji 0 nizak
ključnih događaja	1 visok pr. 0 srednji 0 nizak

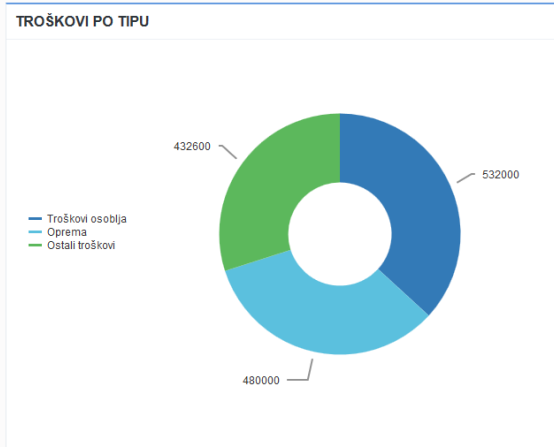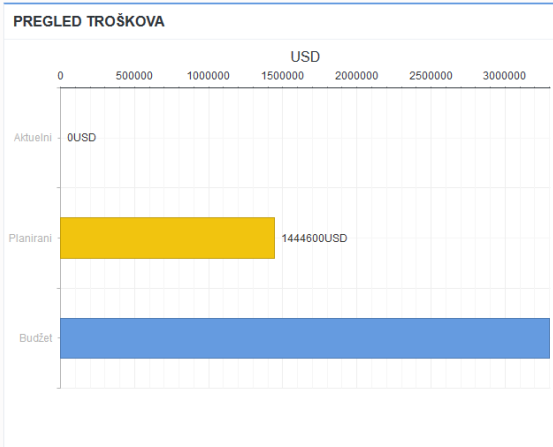


### VRIJEME

NEPLAĆENO VRIJEME	\$ 0
NAPLATIVO VRIJEME	\$ 0
UKUPNO	\$ 0

### BUDŽET


UKUPNI TROŠKOVI	\$ 1444600,000
NAPLATIVO VRIJEME	\$ 0
BUDŽET	\$ 3300000,000 ( 43,78 % potrošeno )

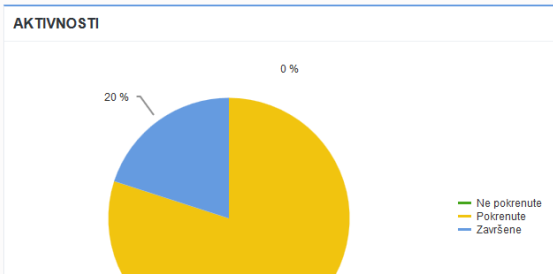

Ne pokrenute	0
Pokrenute	4
Završene	1

# Kontrolna tabla Projekta

# Osnovni podaci o projektu

Dojo Projektat Izveštaji Poruke 1  Odabrani projekat: Izgradnja vodovodne i ka... Demo user

Pregled Aktivnosti Ključni Događaji Troškovi Problemi Rizici Promjene Virtuelni resursi Utrošeno vrijeme Fajlovi Podešavanja projekta

## PROJEKAT: 19 - IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE

Kreiran: 20.7.2019. Kreirao: Demo user Broj ljudi: 2


- Dashboard
- Osnovni podaci**
- Projektni tim
- Kalendar
- Lokacija projekta
- Vlasnik projekta
- Korisnici projekta
- Budžet
- Demografski podaci
- Dokumenti
- Logička matrica
- Presložite aktivnosti

### OSNOVNI PODACI

Id	Broj projekta	Naziv	Valuta	Ukupna vrednost
3	19	Izgradnja vodovodne i kanalizacione infras	Dollar	3.300.000,00
Kategorija	Prioritet	Projekat u skladu sa	Status	
Infrastrukturni projekti	Visok	Strategijom razvoja	U toku	
Početak	Kraj			
1.1.2019.	31.12.2019.	<input type="checkbox"/> <b>Privatni projekat</b> <input type="checkbox"/> <b>Arhiviran</b>		
<b>Opis</b>				
Cilj projekta je zaštita voda tj. vodotoka od zagađivanja otpadnim vodama, odnosno zaštita postojećeg biodiverziteta u vodotoku rijeke kao i zaštita zdravlja stanovnika. Ovim projektom se postiže brže i efikasnije ispunjavanje uslova u procesu približavanja standardima EU u oblasti zaštite životne sredine.				

Sačuvaj Novi

# Kreiranje projektnog tima

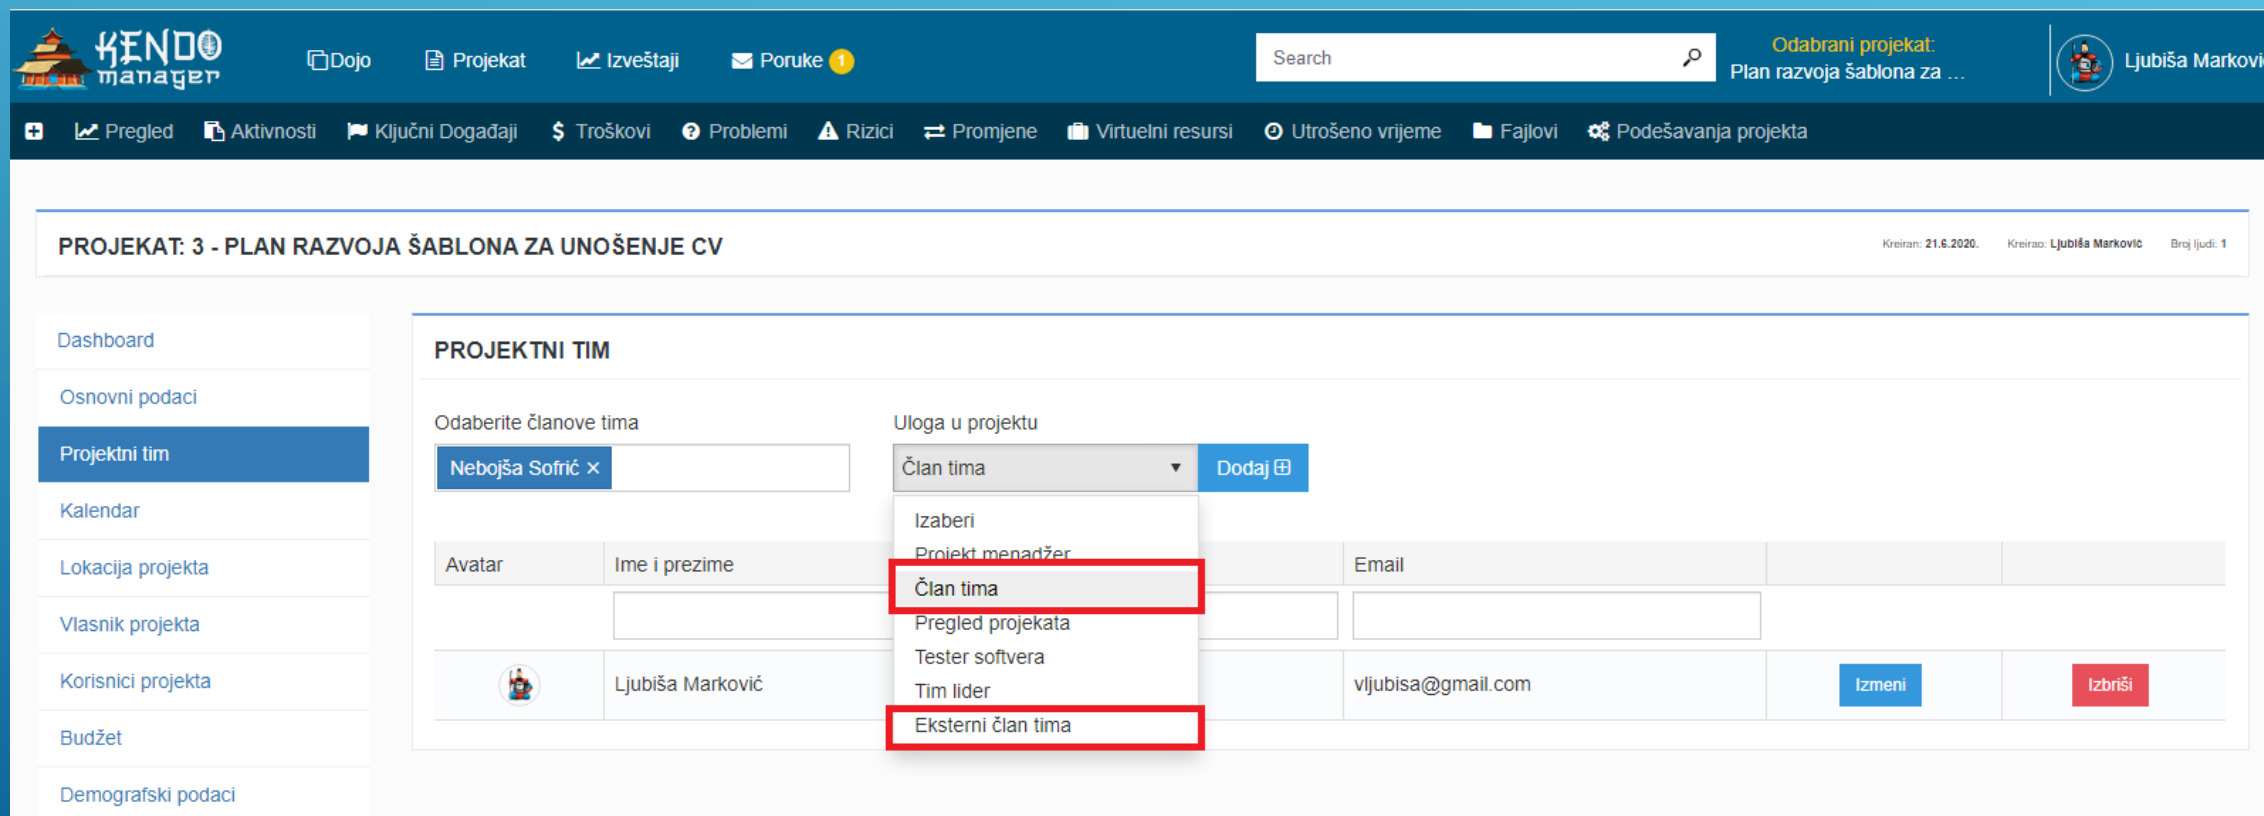


The screenshot displays the KENDO manager interface for a project titled "PROJEKAT: 3 - PLAN RAZVOJA ŠABLONA ZA UNOŠENJE CV". The user is logged in as Ljubiša Marković. The main section is "PROJEKTI TIM", where a dropdown menu is open to select a role for a team member. The dropdown options are: Izaberi, Projekt menadžer, Član tima (highlighted with a red box), Pregled projekata, Tester softvera, Tim lider, and Eksterni član tima (highlighted with a red box). The table below shows the current team member, Ljubiša Marković, with an email address of vljubisa@gmail.com and buttons for "Izmeni" and "Izbriši".

**PROJEKAT: 3 - PLAN RAZVOJA ŠABLONA ZA UNOŠENJE CV** Kreiran: 21.6.2020. Kreirao: Ljubiša Marković Broj ljudi: 1

**PROJEKTI TIM**

Odaberite članove tima:

Uloga u projektu:

Avatar	Ime i prezime		Email	
	Ljubiša Marković	<input type="text"/>	<input type="text" value="vljubisa@gmail.com"/>	<input type="button" value="Izmeni"/> <input type="button" value="Izbriši"/>

# Definisanje budžeta projekta

Dashboard | Pregled | Aktivnosti | Ključni Događaji | Troškovi | Problemi | Rizici | Promjene | Virtualni resursi | Utrošeno vrijeme | Fajlovi | Podešavanja projekta

**PROJEKAT: 19 - IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE** Kreiran: 20.7.2019. | Kreirao: Demo user | Broj ljudi: 2

**BUDŽET**

Institucija ili organizacija:   Iznos:  Valuta:  Preračunati iznos:  Preračunata valuta:

Id	Institucija/organizacija	Iznos	Valuta	Preračunati iznos	Preračunata valuta		
2	Preduzeće komunalnih delatnosti	3300000	Dollar	4566666,000	Srpski dinar	<input type="button" value="Izaberi"/>	<input type="button" value="Izbriši"/>

Dashboard | Osnovni podaci | Projektni tim | Kalendar | Lokacija projekta | Vlasnik projekta | Korisnici projekta | **Budžet** | Demografski podaci

# Projektna dokumentacija

Pregled Aktivnosti Ključni Događaji Troškovi Problemi Rizici Promjene Virtualni resursi Utrošeno vrijeme Fajlovi Podešavanja projekta

**PROJEKAT: 3 - PLAN RAZVOJA ŠABLONA ZA UNOŠENJE CV** Kreiran: 21.6.2020. Kreirao: Ljubiša Marković Broj ljudi: 1

- Dashboard
- Osnovni podaci
- Projektni tim
- Kalendar
- Lokacija projekta
- Vlasnik projekta
- Korisnici projekta
- Budžet
- Demografski podaci
- Dokumenti**
- Logička matrica
- Presložite aktivnosti


### DOKUMENTI

Opis dokumenta

Opis dokumenta	Naziv dokumenta	Datum	Dokument postavio	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
App Suno formular	app sumo.pdf	15.7.2020. 14.20.20	Ljubiša Marković	<input type="button" value="Izbriši"/>

# Kreiranje liste Aktivnosti

- WBS dijagram
- Gantt opcija
- Kanban Tabla
- Definisane vremenskog trajanja aktivnosti (start, end, dedline)
- Delegiranje aktivnosti članovima projektnog tima
- Definisane resursa

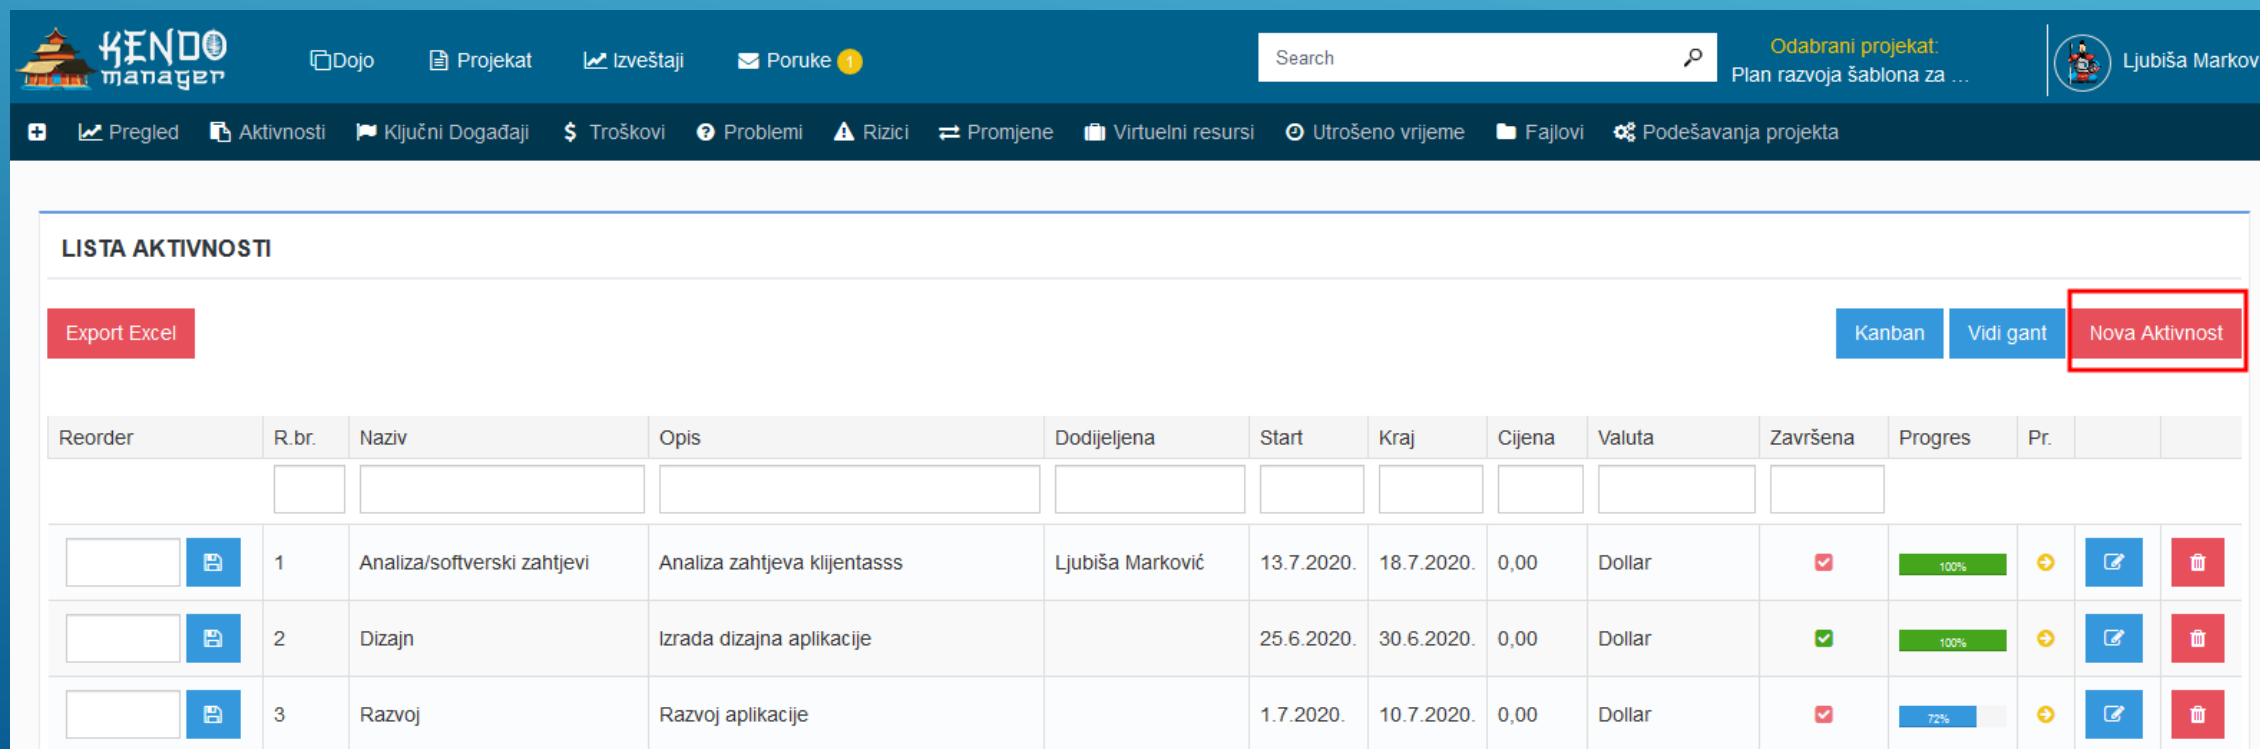

The screenshot displays the KENDO manager web application interface. At the top, there is a navigation bar with the KENDO manager logo, a search bar, and user information (Ljubiša Marković). Below the navigation bar is a menu with various project management options like 'Pregled', 'Aktivnosti', 'Troškovi', etc. The main content area is titled 'LISTA AKTIVNOSTI' and contains a table of activities. The table has columns for Reorder, R.br., Naziv, Opis, Dodijeljena, Start, Kraj, Cijena, Valuta, Završena, Progres, and Pr. There are three rows of activities listed. The 'Nova Aktivnost' button is highlighted with a red box.

Reorder	R.br.	Naziv	Opis	Dodijeljena	Start	Kraj	Cijena	Valuta	Završena	Progres	Pr.
	1	Analiza/softverski zahtjevi	Analiza zahtjeva klijentasss	Ljubiša Marković	13.7.2020.	18.7.2020.	0,00	Dollar	✓	100%	
	2	Dizajn	Izrada dizajna aplikacije		25.6.2020.	30.6.2020.	0,00	Dollar	✓	100%	
	3	Razvoj	Razvoj aplikacije		1.7.2020.	10.7.2020.	0,00	Dollar	✓	72%	

# Kreiranje aktivnosti na projektu



Pregled Aktivnosti Ključni Događaji Troškovi Problemi Rizici Promjene Virtualni resursi Utrošeno vrijeme Fajlovi Podešavanja projekta

## AKTIVNOST: REKONSTRUKCIJA I PROŠIRENJE POSTOJEĆE VODOVODNE MREŽE

### Osnovni podaci

Članovi tima

Resursi

Komentari

Dokumenti

Podaktivnosti/Reordering

### OSNOVNI PODACI

Naziv

Rekonstrukcija i proširenje postojeće vodovodne mreže

Prioritet

Visok

Ključni događaj

Pripada aktivnosti

Ukupna vrednost

1.600.000,00

Valuta

Dollar

Opis

Radovi na rekonstrukciji i proširenju postojeće vodovodne mreže

Početak

12.2.2019.

Kraj

1.1.2020.

Završena

Završena

Trajanje aktivnosti (dana)

323

Radni fond (sati)

2.664,00

Progres do sada

40%

Posljednji ažurirao

Demo user

Posljednje ažuriranje

21.7.2019. 14.45.00

Obavijesti korisnike

Sačuvaj

Novi

# Dodijelite zadatak članu ili članovima tima

**AKTIVNOST: ANALIZA/SOFTVERSKI ZAHTJEVI**

Osnovni podaci

**Članovi tima**

Resursi

Komentari


Dokumenti

Podaktivnosti/Reordering

**AKTIVNOST DODIJELJENA**


Odaberite člana tima

[Dodaj](#)

Avatar	Ime i prezime	Email	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Ljubiša Marković	vljubisa@gmail.com	<a href="#">Izbriši</a>



# Zadaci su prikazani na ličnoj kontrolnoj tabli korisnika (Moja kontrolna tabla)

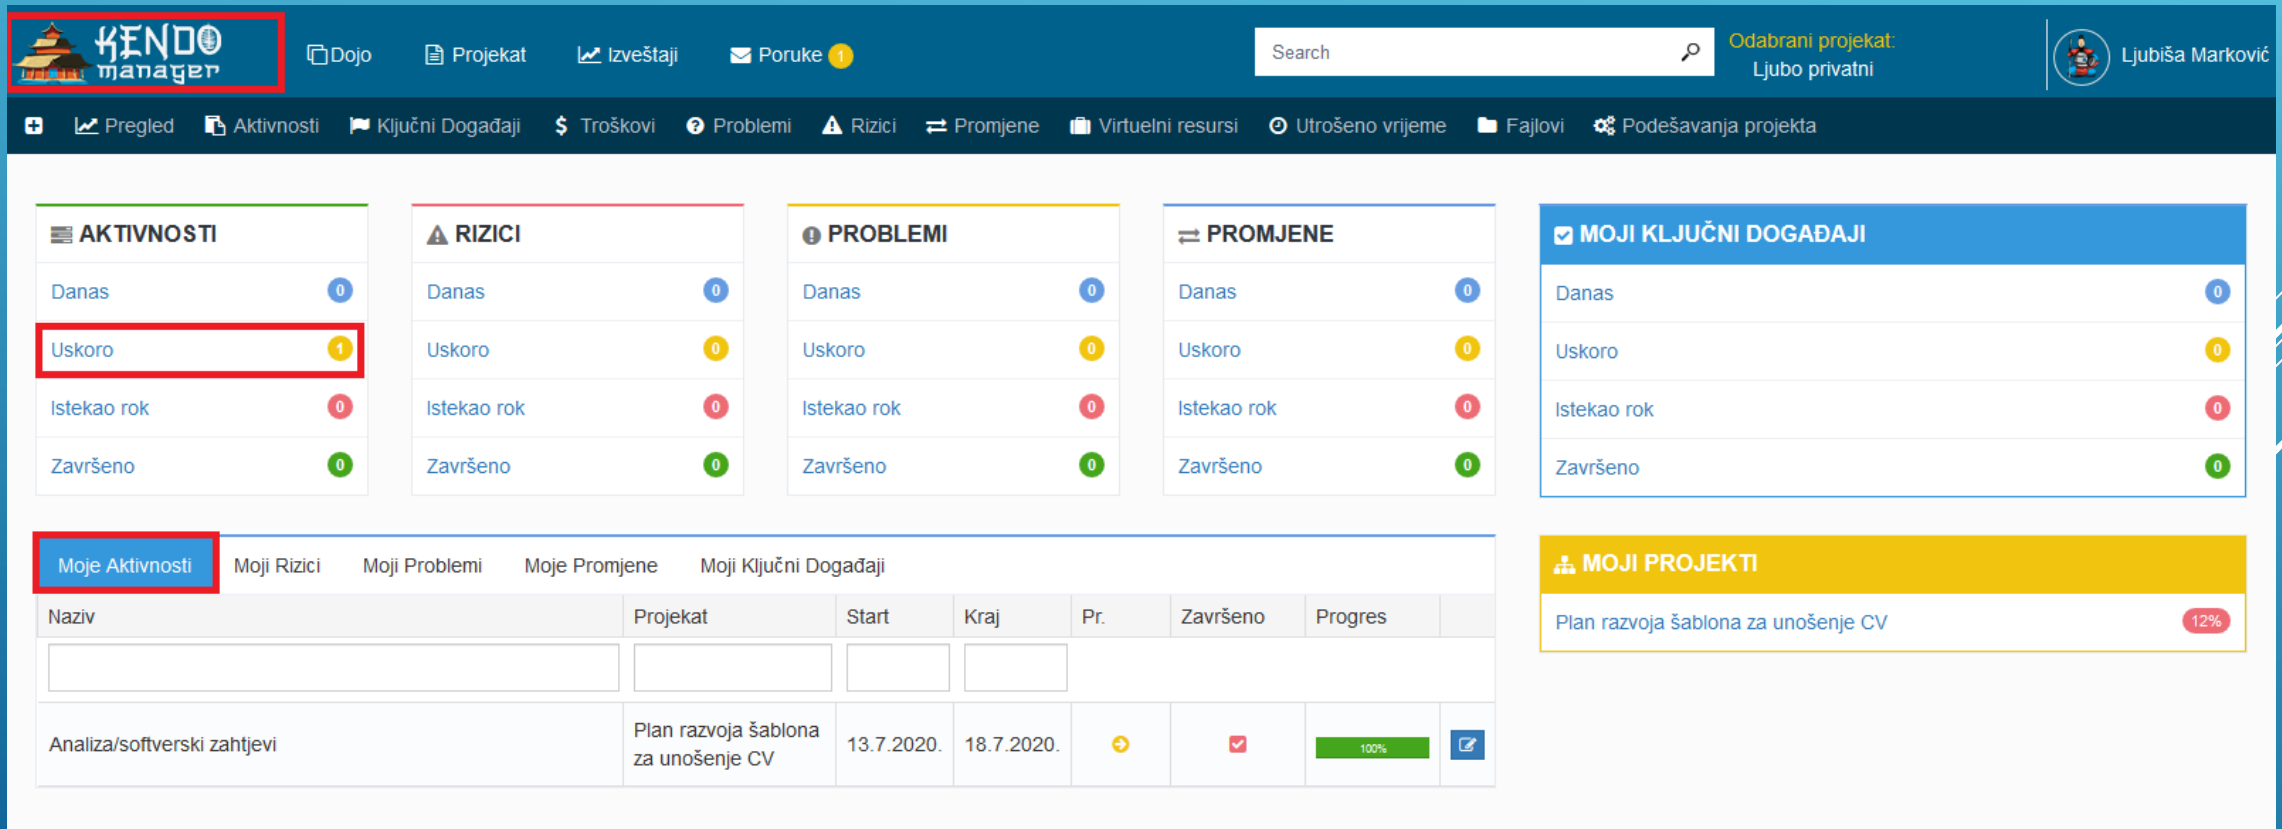

The screenshot displays the KENDO manager dashboard. At the top, there is a navigation bar with the KENDO manager logo, a search bar, and the user's name 'Ljubiša Marković'. Below the navigation bar, there are several tabs for different dashboard sections: Pregled, Aktivnosti, Ključni Događaji, Troškovi, Problemi, Rizici, Promjene, Virtualni resursi, Utrošeno vrijeme, Fajlovi, and Podešavanja projekta. The main content area is divided into several panels. On the left, there are four panels: AKTIVNOSTI, RIZICI, PROBLEMI, and PROMJENE. Each panel shows a list of task statuses with corresponding counts. The 'Uskoro' status is highlighted in red in the AKTIVNOSTI panel. On the right, there is a panel for MOJI KLJUČNI DOGAĐAJI and a panel for MOJI PROJEKTI. The MOJI PROJEKTI panel shows a project 'Plan razvoja šablona za unošenje CV' with a 12% progress indicator. Below these panels, there is a table for 'Moje Aktivnosti' with columns for Naziv, Projekat, Start, Kraj, Pr., Završeno, and Progres. The table contains one row for 'Analiza/softverski zahtjevi' with a progress bar at 100%.

Naziv	Projekat	Start	Kraj	Pr.	Završeno	Progres
Analiza/softverski zahtjevi	Plan razvoja šablona za unošenje CV	13.7.2020.	18.7.2020.	→	✓	100%

# Prikaz aktivnosti

- Lista aktivnosti (taskova)
- **Gantt**
- Kanban

## GANTT PREGLED

Kanban
Lista Aktivnosti

**Filtriranje:**  Sve aktivnosti  Visokog prioriteta  
 Niskog prioriteta  Srednjeg prioriteta

**Završen:**  Sve aktivnosti  Nezavršene  Završene

**Dodjeljena**


Skupi sve
Raširi sve
Kritični put

**Zumiranje:**  Sat  Dan  Mjesec  Godina

Redni broj	Naziv aktivnosti	Početak	Trajanje	Prioritet	Dodjeljen	+	2019												#	
							#Jan	#Feb	#Mar	#Apr	#May	#Jun	#Jul	#Aug	#Sep	#Oct	#Nov	#Dec		
1	Izgradnja vodovodn	12.02.2019	325			+														
							48% Izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture													
1.1	Rekonstrukcija i	12.02.2019	170	visok	Demo user	+														
							40% Rekonstrukcija i proširenje postojeće vodovodne mreže													
1.1.1	Postavljanje s	01.08.2019	122	srednji	Demo user	+														
							12% Postavljanje sektorskih vodomjera													

# Task mode

- Lista aktivnosti (taskovi)
- Gantt
- **Kanban**

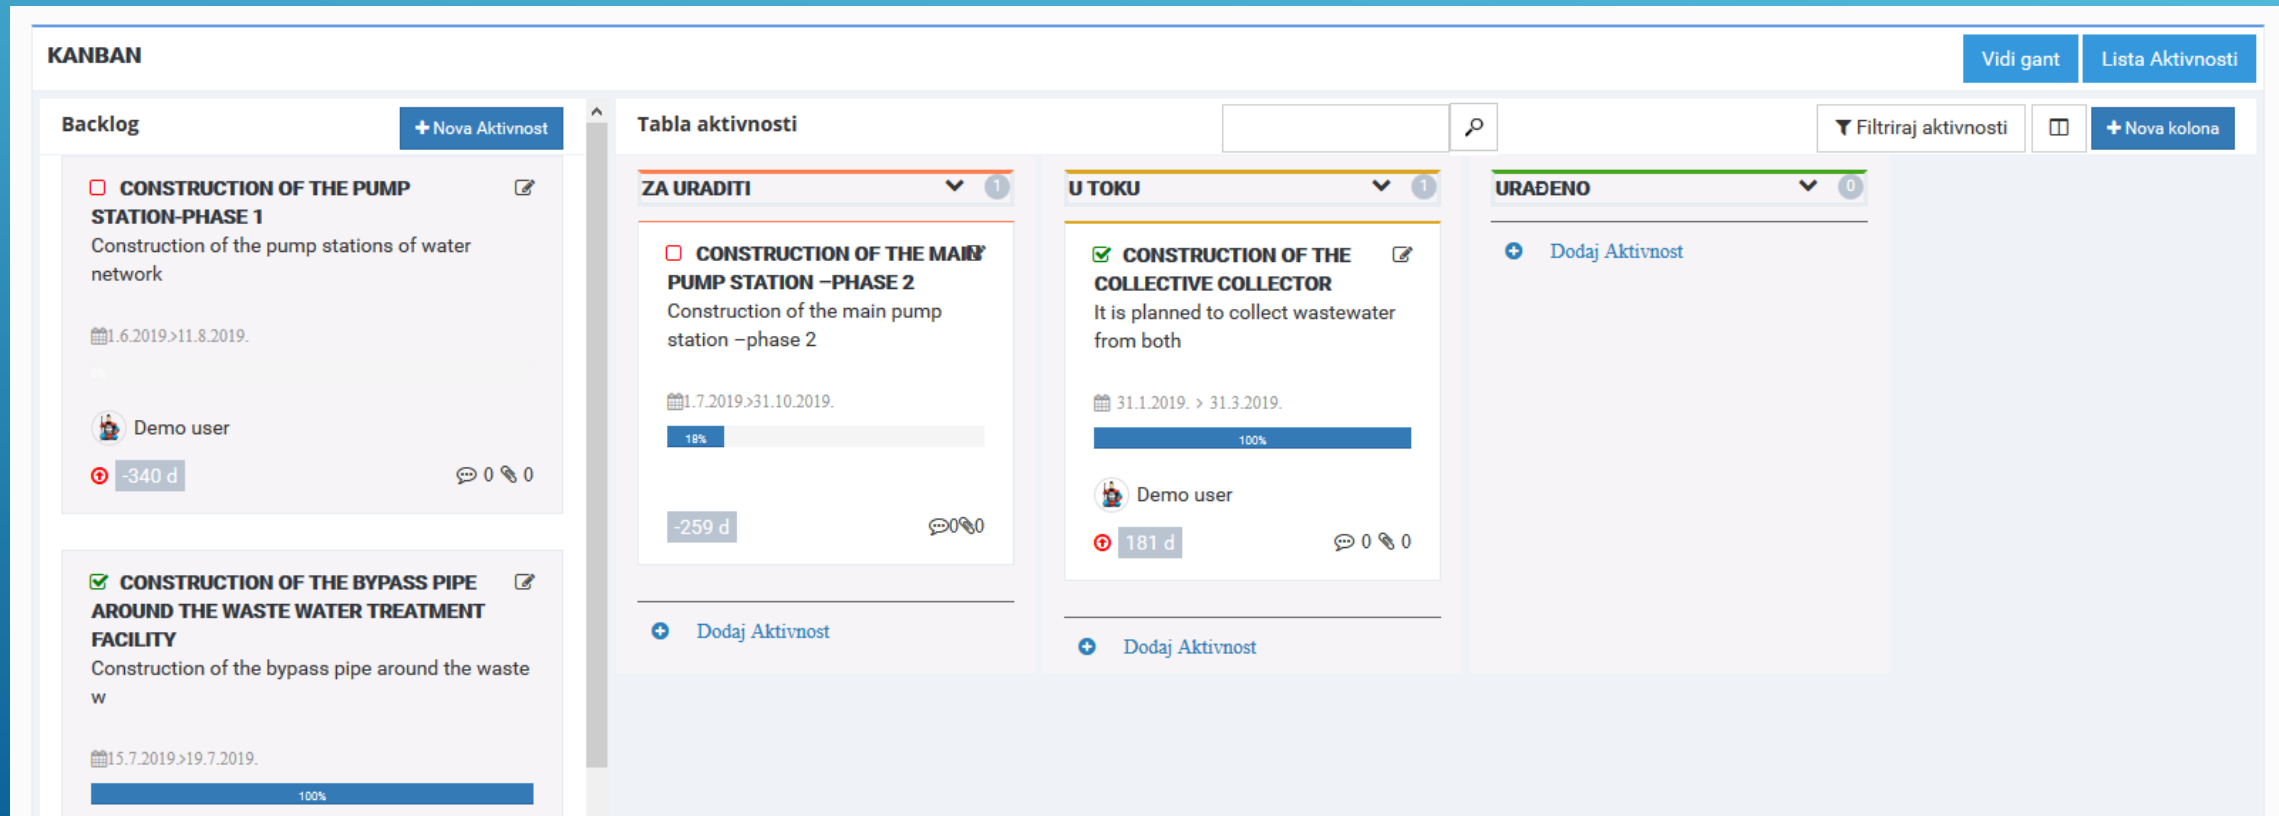

The screenshot displays the Kanban board interface in the KENDO application. The board is titled "KANBAN" and features a top navigation bar with "Vidi gantt" and "Lista Aktivnosti" buttons. The main area is divided into a "Backlog" column on the left and a "Tabla aktivnosti" (Kanban board) on the right. The "Backlog" column contains two task cards: "CONSTRUCTION OF THE PUMP STATION-PHASE 1" (due 11.8.2019) and "CONSTRUCTION OF THE BYPASS PIPE AROUND THE WASTE WATER TREATMENT FACILITY" (due 19.7.2019). The "Tabla aktivnosti" board is organized into three columns: "ZA URADITI" (1 task), "U TOKU" (1 task), and "URADENO" (0 tasks). The "ZA URADITI" column shows a task for "CONSTRUCTION OF THE MAIN PUMP STATION -PHASE 2" (due 31.10.2019) with 18% progress. The "U TOKU" column shows a task for "CONSTRUCTION OF THE COLLECTIVE COLLECTOR" (due 31.3.2019) with 100% progress. The "URADENO" column is currently empty. Each task card includes a title, description, due date, progress bar, assignee, and a "Dodaj Aktivnost" button.

# Task mode

- **Lista aktivnosti**
- Gantt
- Kanban

**LISTA AKTIVNOSTI**

Export Excel Kanban Vidi gant Nova Aktivnost

Reorder	R.br.	Naziv	Opis	Dodijeljena	Start	Kraj	Cijena	Valuta	Završena	Progres	Pr.		
	1	Rekonstrukcija i proširenje postojeće vodovodne mreže	Radovi na rekonstrukciji i proširenju postojeće vodovodne mreže	Demo user	12.2.2019.	1.8.2019.	1.600.000,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 40%;"><div style="width: 40%;"></div></div> 40%	+		
	1.1	Postavljanje sektorskih vodomjera	Izrada i postavljanje betonskih šahtova u koje se postavljaju sektorski vodomjeri	Demo user	1.8.2019.	1.12.2019.	350.000,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 12%;"><div style="width: 12%;"></div></div> 12%	→		
	2	Izgradnja vodovodnog sistema	Izgradnja hidrantske mreže i proširenje cjevovoda	Demo user	1.10.2019.	1.1.2020.	900.000,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 27%;"><div style="width: 27%;"></div></div> 27%	+		
	3	Izgradnja glavnog kolektora	Radovi na izradi novog glavni kolektor		30.8.2019.	30.8.2019.	800.000,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 62%;"><div style="width: 62%;"></div></div> 62%	+		
	4	Optimizacija postojećeg sistema	Optimizacija rada pumpi u prepumpnim stanicama		1.11.2019.	3.1.2020.	800.000,00	Dollar	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	→		

# Upravljanje resursima

Bilo da je riječ o osobi, materijalu ili objektu, s Kendom je moguće učinkovito koristiti resurse.

Pregled Aktivnosti Ključni Događaji Troškovi Problemi Rizici Promjene **Virtuelni resursi** Utrošeno vrijeme Fajlovi Podešavanja projekta

## RESURSI NA PROJEKTU

Resurs za projekat  + Tip resursa  Vrijednost **Izaberi** ▼ Trošak

[Sačuvaj](#)

Id	Resurs za projekat	Tip resursa	Vrijednost	Trošak		
		<input type="text"/>				
4	Električni kabal	Materijalni resursi	m	10,00	<a href="#">Izbriši</a>	<a href="#">Izmeni</a>

# Dodajte resurse na projektne aktivnosti

## AKTIVNOST: OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SISTEMA

Osnovni podaci

Članovi tima

**Resursi**

Komentari

Dokumenti

Podaktivnosti/Reordering

### RESURSI

Naziv resursa	Iznos	Vrijednost	Trošak	Opis
<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>
Posljednji ažurirao	Posljednje ažuriranje			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Obavijesti korisnike

Sačuvaj Odustani

Naziv resursa	Iznos	Vrijednost	Trošak	Opis		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Električni kabal	100,00	m	1000,00	Instalacioni kabal	Izmeni	Izbriši

# Upravljanje troškovima na projektu



Pomoću Kendo Managera možete lako planirati, upravljati i kontrolisati troškove na projektu.

**PROJEKAT: 19 - IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE** Kreirao: 20.7.2019. Kreirao: Demo user Broj ljudi: 2

**TROŠKOVI**

[Novi trošak](#) [Alternativni troškovi](#) [Export PDF](#) [Export Excel](#) [Export Word](#)

Naziv	Planirani trošak	Aktivnost	Tip	Jed. mere	Broj jedinica	Cijena po mj. jedinici	Ukupan iznos bez poreza	Iznos poreza	Total		
Radovi na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže	Da	Rekonstrukcija i proširenje postojeće vodovodne mreže	Troškovi osoblja	kom	133,00	4000,00 (\$)	532000,00 (\$)	0,00 (\$)	532000,00 (\$)	<a href="#">Izbriši</a>	<a href="#">Izaberi</a>
Postavljanje sektorskih vodomjera	Da	Postavljanje sektorskih vodomjera	Ostali troškovi	kom	42,00	3500,00 (\$)	147000,00 (\$)	0,00 (\$)	147000,00 (\$)	<a href="#">Izbriši</a>	<a href="#">Izaberi</a>
Postavljanje cijevi	Da	Izgradnja vodovodnog sistema	Ostali troškovi	kom	112,00	2550,00 (\$)	285600,00 (\$)	0,00 (\$)	285600,00 (\$)	<a href="#">Izbriši</a>	<a href="#">Izaberi</a>
Nabavka pumpi za vodu	Da	Izgradnja glavnog kolektora	Oprema	kom	12,00	40000,00 (\$)	480000,00 (\$)	0,00 (\$)	480000,00 (\$)	<a href="#">Izbriši</a>	<a href="#">Izaberi</a>
							<b>1444600,00 (\$)</b>	<b>0,00 (\$)</b>	<b>1444600,00 (\$)</b>		

# Forma Troškovi



## TROŠKOVI

Trošak

Alternativni trošak

Naziv

Nabavka pumpi za vodu

Planirani trošak

Datum

21.5.2019.

Odaberite aktivnost

Izgradnja glavnog kolektora

Cijena po mj. jedinici

40.000,00

Broj jedinica

12,00

Iznos poreza

0,00

Ukupna vrijednost bez poreza

480.000,00

Jed. mere

kom

Iznos

480.000,00

Tip

Oprema

Opis

Nabavka pumpi za vodu

Posljednji ažurirao

Demo user

Posljednje ažuriranje

16.7.2020. 14.16.08

Obavijesti korisnike

Sačuvaj

Novi



# Time management



- Efikasno upravljanje utrošenim vremenom na projektu

Navigation bar: Pregled, Aktivnosti, Ključni Događaji, Troškovi, Problemi, Rizici, Promjene, Virtualni resursi, **Utrošeno vrijeme**, Fajlovi, Podešavanja projekta

PROJEKAT: 3 - PLAN RAZVOJA ŠABLONA ZA UNOŠENJE CV Kreiran: 21.6.2020. Kreirao: Ljubiša Marković Broj ljudi: 1

Dashboard

Osnovni podaci

Projektni tim

Kalendar

Lokacija projekta

Vlasnik projekta

Korisnici projekta

### VRIJEME

[Novi utrošak vremena](#) [Export PDF](#) [Export Excel](#) [Export Word](#)

NEPLAĆENO VRIJEME: 0 \$ - NAPLATIVO VRIJEME: 150,00 \$ - TOTAL: 150,00 \$

Aktivnost	Korisnik	Datum	Opis	Utrošeno vrijeme	Naplativo	Iznos		
Analiza/softverski zahtjevi	Ljubiša Marković	16.7.2020.	Kreiranje dokumentacije	10h 10min	Da	150,00	<a href="#">Izbriši</a>	<a href="#">Izaberi</a>

# Praćenje problema na projektu



- Upotrebite Kendo Manager za upravljanje problemima na projektu
- Delegirajte članovima projektnog tima problem za rješavanje i kreirajte vezu s određenim zadatkom na projektu.
- Sa Kendo Managerom možete jednostavno kreirati izveštaj o problemima na projektu.

Dashboard

Osnovni podaci

Projektni tim

Kalendar

Lokacija projekta

Vlasnik projekta

Korisnici projekta

Budžet

**PROJEKAT: 19 - IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE**

Kreiran: 20.7.2019. Kreirao: Demo user Broj ljudi: 2

**PROBLEMI**

Novi problem

Export PDF Export Excel Export Word

Naziv	Dodijeljen	Informisao	Aktivnosti	Završen		
Nabavka pumpi za vodu		Davor Jotanović		<input checked="" type="checkbox"/>	Izbriši	Izaberi

# Upravljanje rizicima projekta



- Nema projekta bez rizika
- Sa Kendo Managerom možete indentifikovati i upravljati rizicima u projektu, i minimizovati njihov uticaj na projektne aktivnosti

Pregled Aktivnosti Ključni Događaji Troškovi Problemi **Rizici** Promjene Virtualni resursi Utrošeno vrijeme Fajlovi Podešavanja projekta

**PROJEKAT: 19 - IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE** Kreiran: 20.7.2019. Kreirao: Demo user Broj ljudi: 2

Dashboard  
Osnovni podaci  
Projektni tim  
Kalendar  
Lokacija projekta  
Vlasnik projekta  
Korisnici projekta  
Budžet

### RIZICI

[Novi rizik](#) [Export PDF](#) [Export Excel](#) [Export Word](#)

Naziv	Dodijeljen	Aktivnosti	Završen		
Probijanje Budžeta projekta			<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Izbriši</a>	<a href="#">Izaberi</a>

# Forma za unos rizika



PROJEKAT: 19 - IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE

Kreiran: 20.7.2019. Kreirao: Demo user Broj ljudi: 2

Rizik

Članovi tima

Aktivnosti

Komentari

## RIZIK

Naziv

Probijanje Budžeta projekta

O riziku obavjestio

Srđan

Završen

Opis

Ministarstvo traži su od opštine da poveća sredstva za izgradnju vodovoda

Datum obavještenja

17.7.2020.



Krajnji rok

20.7.2020.



**Riješen**



Uticaj

Visok uticaj



Verovatnoća

Srednja



Odaberi

Posljednji ažurirao

Demo user

Posljednje ažuriranje

22.7.2020. 13.30.11

# Upravljanje promjenama na projektu



- Prema Institutu za upravljanje projektima (PMI), upravljanje promjenama na projektima je presudan element u uspješnim implementacijama projekata, ali nedostaje mu dosljedno razumijevanje i uvažavanje. Promjene možete zabilježiti na kartici Promjene i dodijeliti ih članovima projektnog tima koji ih trebaju riješiti.


The screenshot shows the KENDO manager interface. The top navigation bar includes the KENDO manager logo, navigation icons for Dojo, Projekat, Izveštaji, and Poruke (2), a search bar, and the user profile 'Ljubiša Marković'. The main navigation bar contains icons for Pregled, Aktivnosti, Ključni Događaji, Troškovi, Problemi, Rizici, and **Promjene** (highlighted with a red box), along with icons for Virtualni resursi, Utrošeno vrijeme, Fajlovi, and Podešavanja projekta.

The main content area displays the project title 'PROJEKAT: 3 - PLAN RAZVOJA ŠABLONA ZA UNOŠENJE CV' and metadata: 'Kreiran: 21.6.2020.', 'Kreirao: Ljubiša Marković', and 'Broj ljudi: 1'. A sidebar on the left lists navigation options: Dashboard, Osnovni podaci, Projektni tim, Kalendar, Lokacija projekta, Vlasnik projekta, Korisnici projekta, and Budžet.

The 'PROMJENE' section features a 'Nova promjena' button and three export buttons: 'Export PDF', 'Export Excel', and 'Export Word'. Below is a table of changes:

Naziv	Dodijeljen	Informisao	Aktivnosti	Završen		
Promjena Menadžera na projektu	Ljubiša Marković	Marko	Analiza/softverski zahtjevi	<input checked="" type="checkbox"/>	Izbriši	Izaben


# Svi fajlovi i dokumenti projekata na jednom mjestu

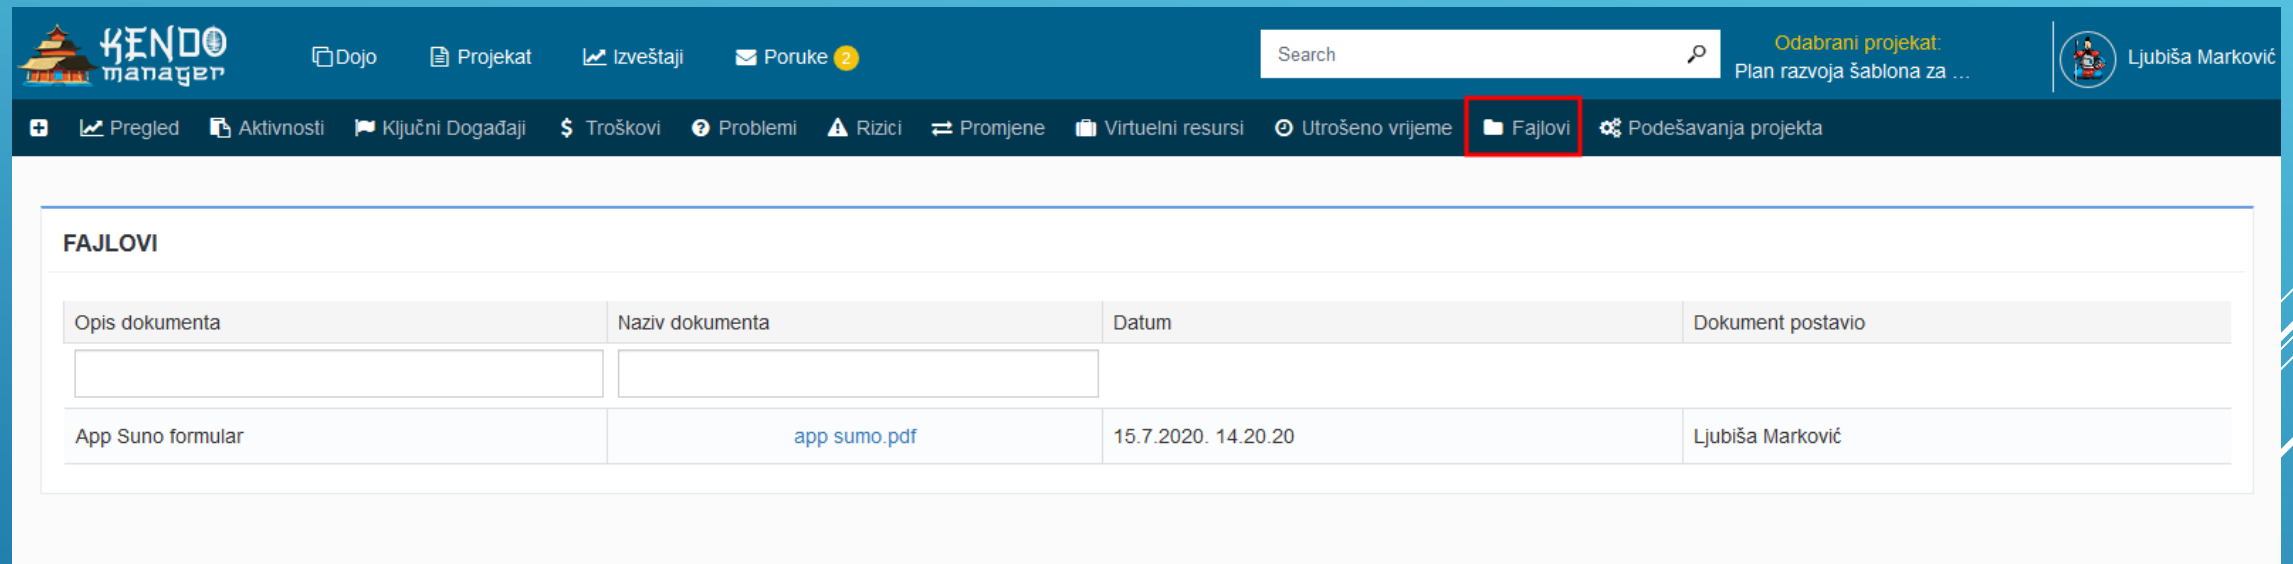

The screenshot shows the KENDO manager web application interface. The top navigation bar includes the KENDO manager logo, a search bar, and a list of menu items: Dojo, Projekat, Izveštaji, Poruke (with a notification badge), Fajlovi (highlighted with a red box), and Podešavanja projekta. The 'FAJLOVI' section is active, displaying a table of documents.

Opis dokumenta	Naziv dokumenta	Datum	Dokument postavio
App Suno formular	app sumo.pdf	15.7.2020. 14.20.20	Ljubiša Marković

# Dojo – Svi aktivni projekti na jednom mjestu

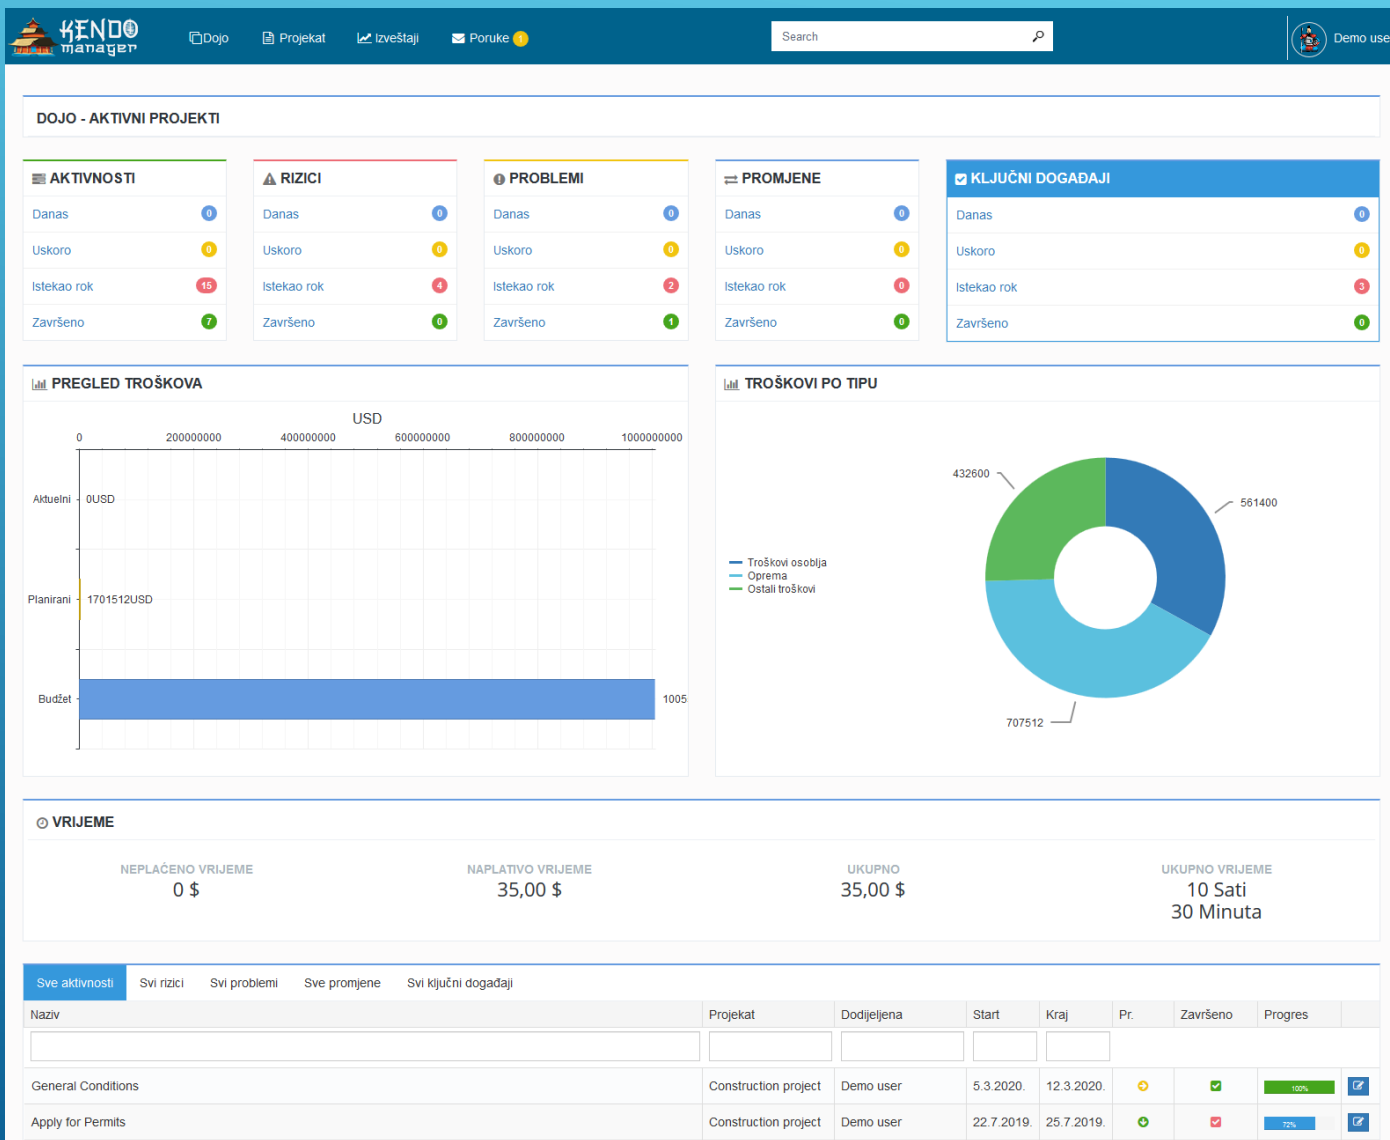

- Uz Kendo Manager, direktor i menadžeri mogu pratiti sve aktivne projekte i sve aktivnosti u projektima istovremeno sa jedne kontrolne table.

- Svi detalji koji su važni se lako mogu vidjeti, uključujući projektne aktivnosti, probleme i promene u projektu, rizici, ključni događaji, ukupni troškovi i ukupno vreme provedeno u realizaciji projekata.

# Komunikacija na projektima



Kendo menadžer ima integrisan fleksibilni informacijski sistem za komunikaciju na projektu

- **Sistemske poruke** – korisnik prima poruke i obavještenja u inbox unutar sistema
- **E-mail notifikacije** – korisnik prima poruke i obavještenja putem e-maila

KENDO manager

Dojo Projekt Izveštaji **Poruke 2** Search Odabrani projekat: Plan razvoja šablona za ... Ljubiša Marković

Pregled Aktivnosti Ključni Događaji Troškovi Problemi Rizici Promjene Virtualni resursi Utrošeno vrijeme Fajlovi Podešavanja projekta

**AKTIVNOST: ANALIZA/SOFTVERSKI ZAHTJEVI**

Obavijesti korisnike

Obeleži sve

Ljubiša Marković  Mirko Mirković

Poruka

Sačuvaj Novi



# Dodavanje komentara i priloga u proces



## AKTIVNOST: IZGRADNJA GLAVNOG KOLEKTORA

Osnovni podaci

Članovi tima

Resursi


Komentari

Dokumenti

Podaktivnosti/Reordering


### KOMENTARI

Napišite komentar



# Izvještaji o projektima

- Jednostavno sastavite razne izvještaje koji prikazuju status pojedinog projekta ili zdravlje cijelog vašeg portfelja. Sa samo nekoliko klikova stvorite: plan projekta, izvještaje o svim zadacima, troškovima i resursima na projektu, izvještaj o rizicima, problemima i promjenama na projektu, ispis, snimanje ili slanje e-poštom svojih izvještaja o projektu
- Export word,excel, pdf

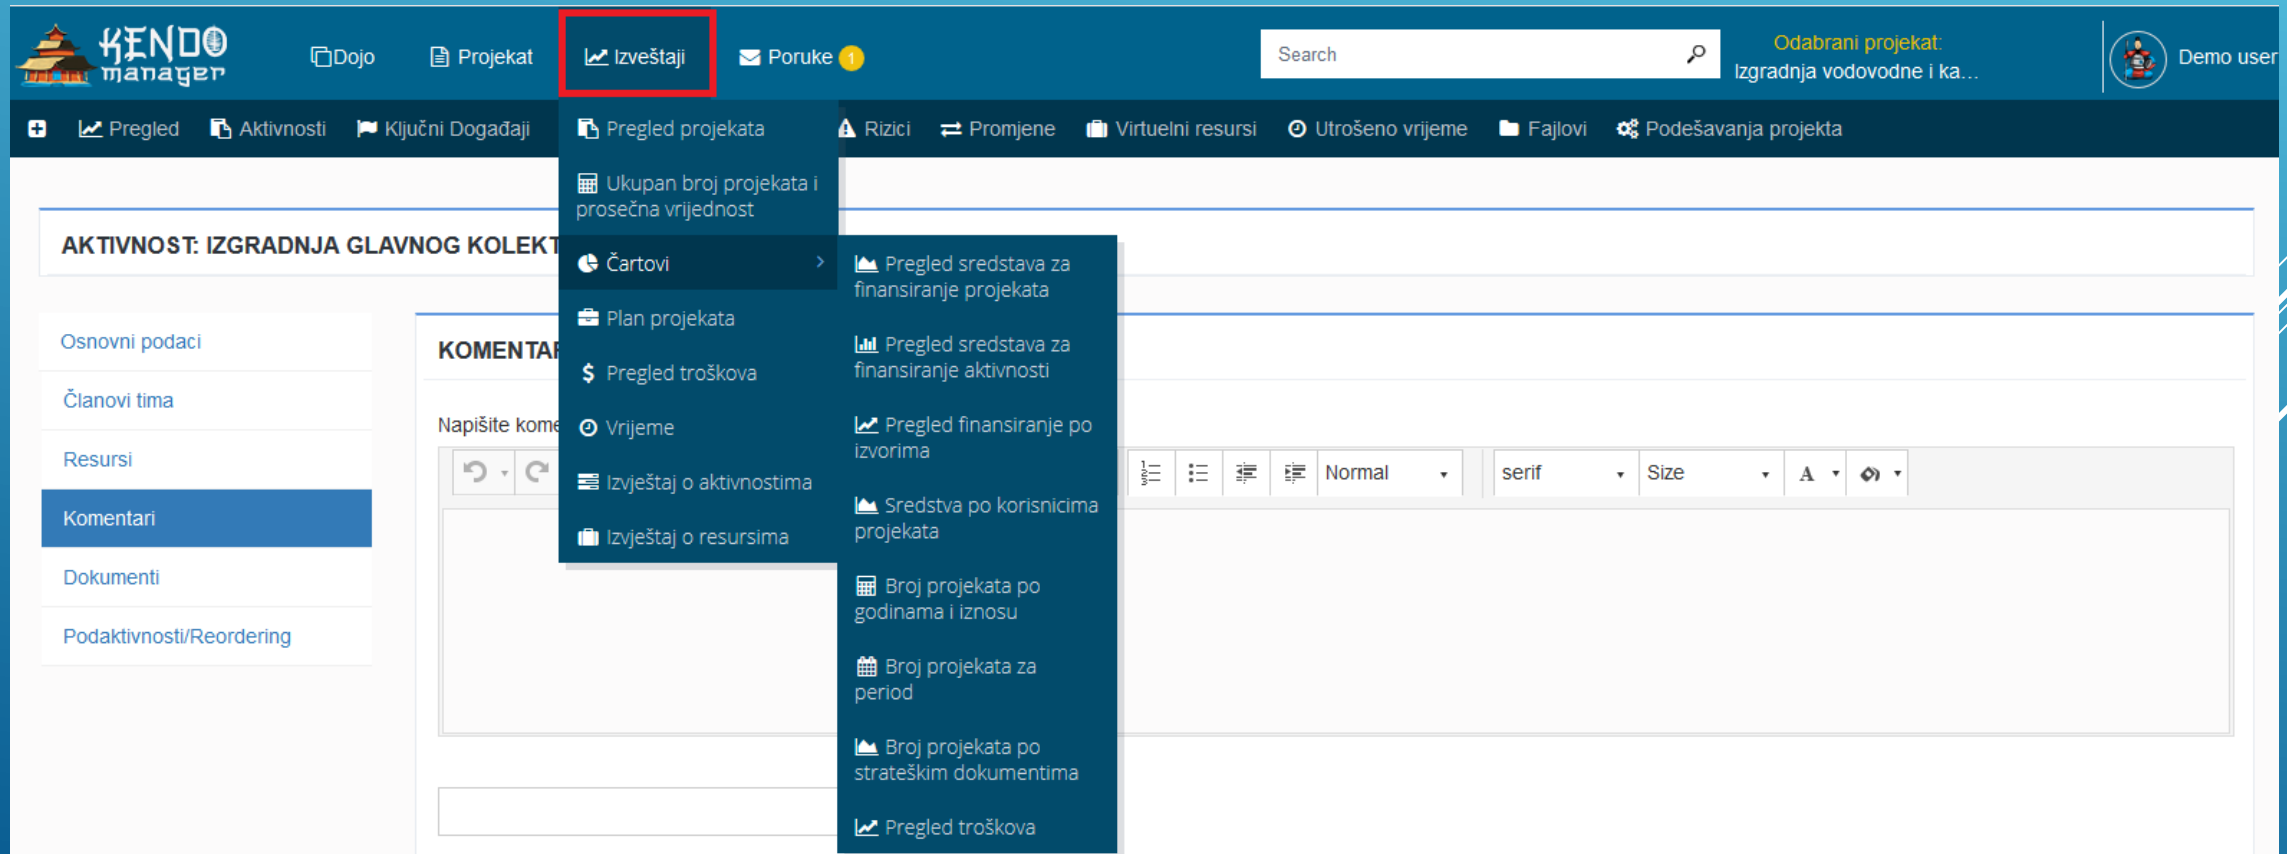

The screenshot displays the KENDO manager web application interface. The top navigation bar includes the KENDO manager logo, a search bar, and the user profile 'Demo user'. The main navigation menu is visible, with the 'Izvještaji' (Reports) option highlighted in a red box. A dropdown menu is open under 'Izvještaji', listing various report types such as 'Pregled projekata', 'Ukupan broj projekata i prosečna vrijednost', 'Čartovi', 'Plan projekata', 'Pregled troškova', 'Vrijeme', 'Izvještaj o aktivnostima', and 'Izvještaj o resursima'. The main content area shows a project overview for 'IZGRADNJA GLAVNOG KOLEKTORNOG SUSTAVA' with a sidebar on the left containing options like 'Osnovni podaci', 'Članovi tima', 'Resursi', 'Komentari', 'Dokumenti', and 'Podaktivnosti/Reordering'.

# Primer – Izvještaj o aktivnostima na projektu



Projekat: Izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture

Generiši izvještaj

1 od 1 Odaberite format za export Export



## Izvještaj o aktivnostima

22.7.2020.

### Osnovni podaci

Naziv: **Izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture**  
Početak: **1.1.2019.**  
Kraj: **31.12.2019.**  
Status: **U toku**  
Budžet: **3300000,000 \$**  
Projekt menadžer: **Administrator;Demo user**  
Kreiran: **22.7.2020.**

### Aktivnosti

R.Br.	Naziv aktivnosti	Opis	Početak	Kraj	Zavrsetak	Dodijeljena	Prioritet	Napredak	Radni fond	Vrijeme	Naplativo	Trošak vremena	Ukupni trošak	Planirani trošak	Trošak resursa	Vrijednost aktivnosti
1	Rekonstrukcija i proširenje postojeće vodovodne mreže	Radovi na rekonstrukciji i proširenju postojeće vodovodne mreže	12.2.2019.	1.8.2019.		Demo user	Visok	40	0,00		0 h 0 min		532000,00 \$	532000,00 \$		1600000,00 \$
1.1	Postavljanje sektorskih vodomjera	Izrada i postavljanje betonskih šahtova u koje se postavljaju sektorski vodomjeri	1.8.2019.	1.12.2019.		Demo user	Normalan	12	0,00		0 h 0 min		147000,00 \$	147000,00 \$		350000,00 \$
2	Izgradnja vodovodnog sistema	Izgradnja hidrantske mreže i proširenje cevovoda	1.10.2019.	1.1.2020.		Demo user	Visok	27	0,00		0 h 0 min		285600,00 \$	285600,00 \$		900000,00 \$
3	Izgradnja glavnog kolektora	Radovi na izradi novog glavnog kolektora	30.8.2019.	30.8.2019.			Visok	62	816,00		0 h 0 min		480000,00 \$	480000,00 \$		800000,00 \$
4	Optimizacija postojećeg sistema	Optimizacija rada pumpi u prepumpnim stanicama	1.11.2019.	3.1.2020.	10.6.2019.		Normalan	100	0,00		0 h 0 min				1000,00 \$	800000,00 \$
UKUPNO									816 h		0 h 0 min		1444600 \$	1444600 \$	1000 \$	4450000 \$

# Multi-jezička podrška




- Srpski, Hrvatski, Bosanski, Engleski, Njemački, Španski, Italijanski i Slovenski jezik


The screenshot displays the KENDO manager dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the KENDO manager logo, navigation icons for Dojo, Projekat, Izveštaji, Poruke, and Obavještenja, a search bar, and a user profile for Administrator. Below the navigation bar is a section titled "POČETNA - MOJA KONTROLNA TABLA" (Dashboard - My Control Panel). This section contains five main panels: AKTIVNOSTI (Activities), RIZICI (Risks), PROBLEMI (Problems), PROMJENE (Changes), and MOJI KLJUČNI DOGAĐAJI (My Key Events). Each panel shows a summary for "Danas" (Today), "Uskoro" (Soon), "Istekao rok" (Deadline), and "Završeno" (Completed) with corresponding counts and status indicators. A dropdown menu is open over the "MOJI KLJUČNI DOGAĐAJI" panel, showing a list of languages with their respective flags: Srpski(lat), Engleski, Engleski (Australija), Španski, Nemački, Hrvatski, Bosanski, Italijanski, and Slovenski. At the bottom of the dashboard, there is a navigation bar with tabs for "Moje Aktivnosti", "Moji Rizici", "Moji Problemi", "Moje Promjene", "Moji Ključni Događaji", and "MOJI PROJEKTI".

# Kendo Manager 3.6

1. Kendo je optimizovan za rad i na ASP Hostingu sa Plesk panel (hosting preporuka interserver.net, hostforlife.eu).
2. Dodali smo box aktivni projekti na Dojo kontrolnu tablu
3. Novi modul - Notifikacije
4. Sensei - CEO dashboards namenjena direktoru kompanije

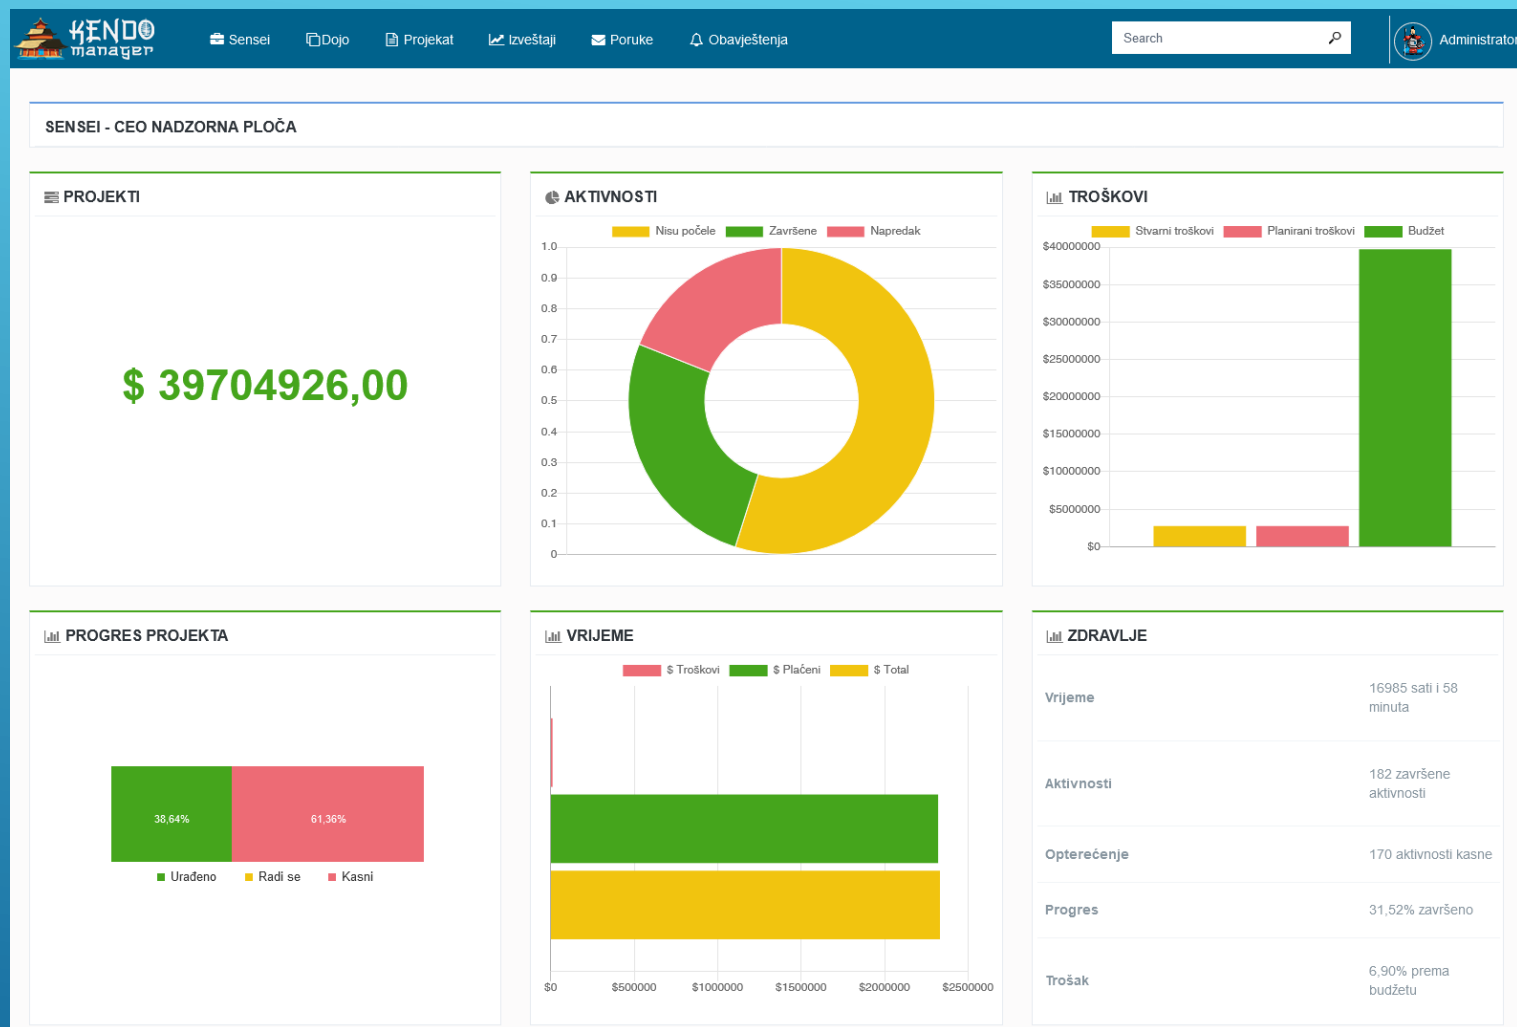

# Kendo Manager 3.6 – Aktivni projekti Box

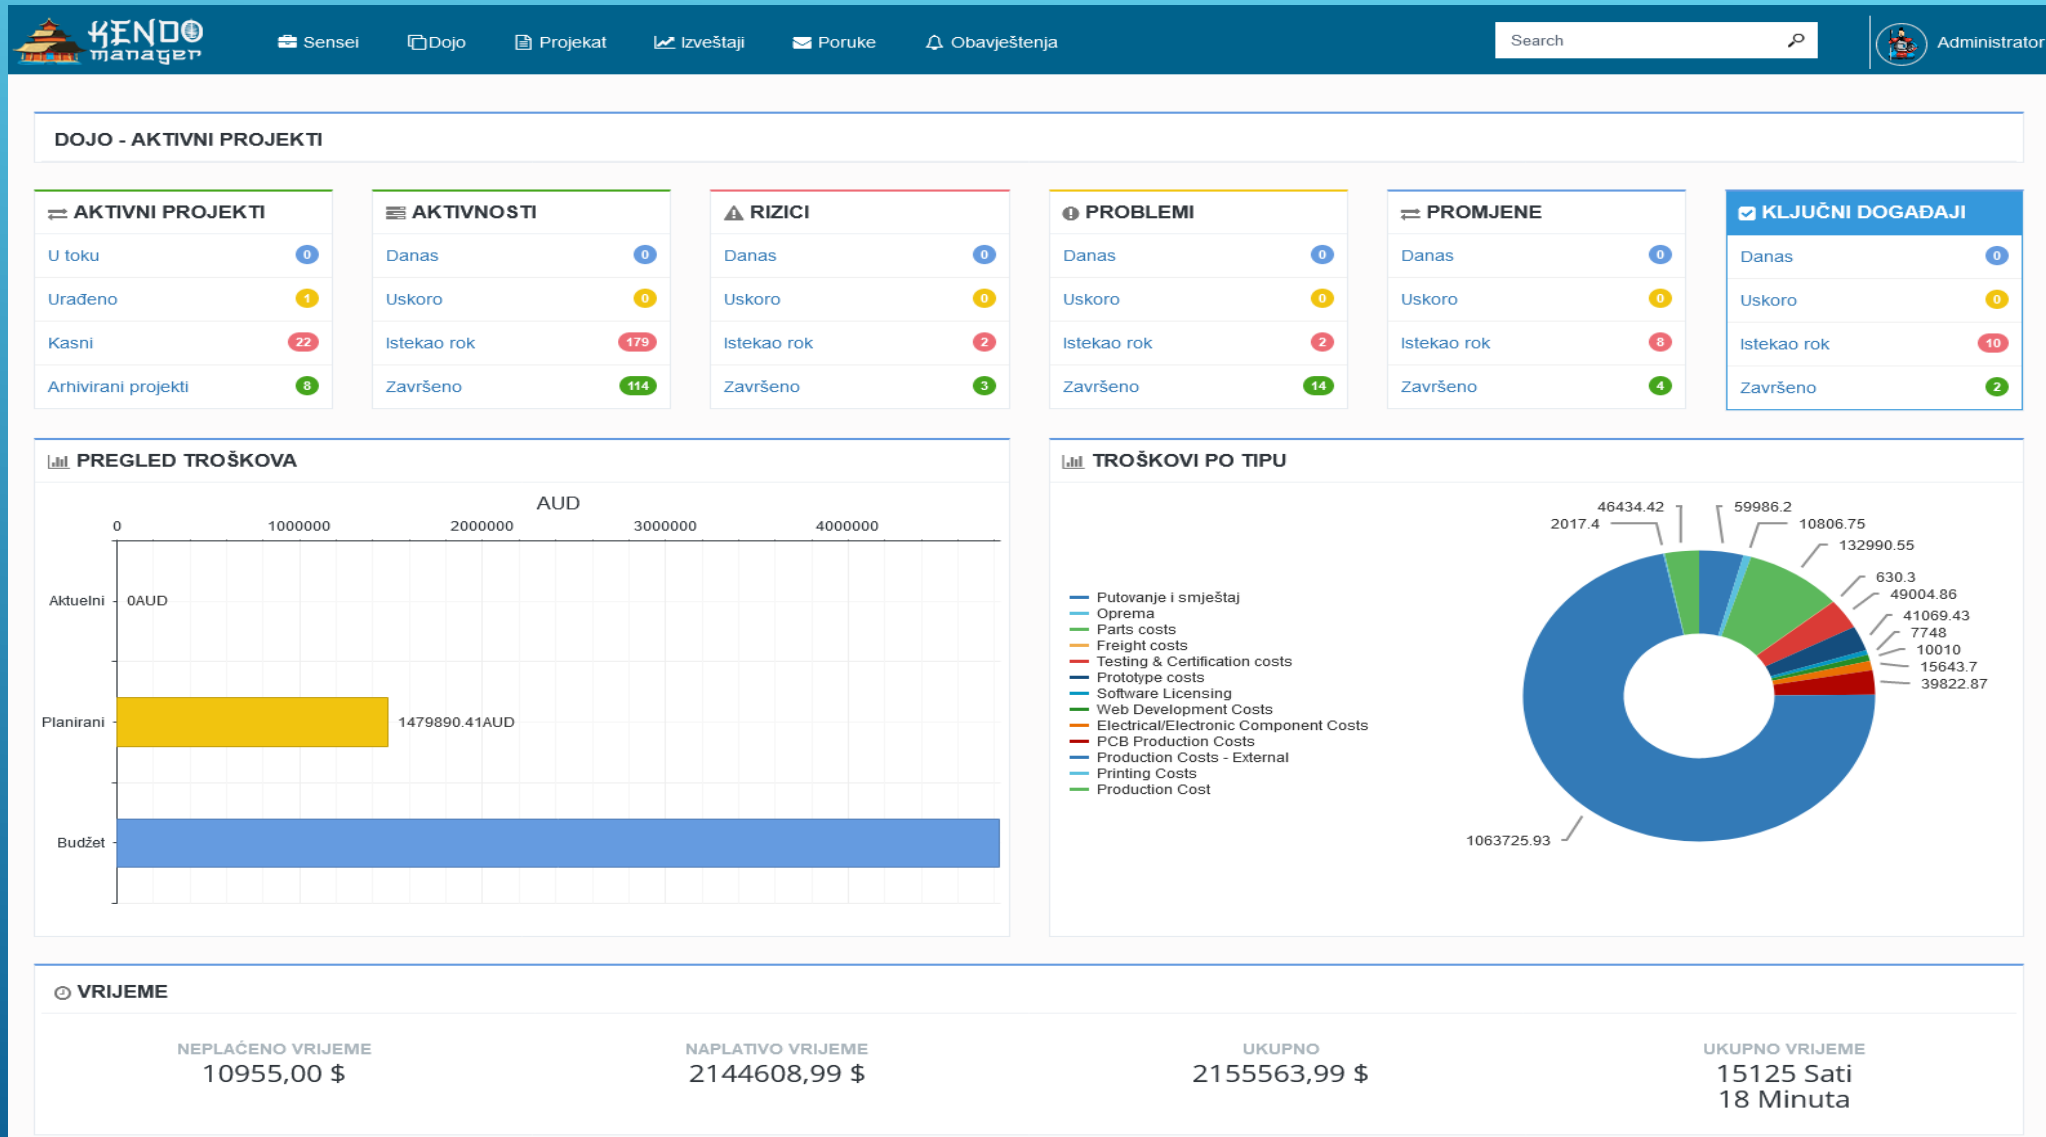

# Kendo Manager 3.6 – aktivni projekti liste



## PROJEKTI Projekti koji kasne

Broj projekta	Naziv	Projekt manager	Početak	Kraj	Prioritet	Arhiviran	Progres	
0003-02-18	Auto Bump - Calibration Dock	Administrator;Radoslav Latinoic;Emil Tastula;Dave Thomson;Katelyn Preston;Leanne Plummer	29.12.2017.	27.3.2020.	Visok	Ne	<div><div style="width: 84%;">84%</div></div>	Izaberi
0007-03-18	USM Distributor Portal	Administrator;Peter Green;Emil Tastula;Dave Thomson;Katelyn Preston;Leanne Plummer	3.7.2017.	28.12.2018.	Visok	Ne	<div><div style="width: 100%;">100%</div></div>	Izaberi
0008-03-18	UDI - Universal Data Interface	Administrator;Peter Green;Dave Thomson;Emil Tastula;Katelyn Preston;Leanne Plummer	2.3.2015.	28.12.2018.	Visok	Ne	<div><div style="width: 88%;">88%</div></div>	Izaberi
0019-03-18	PSM 50 Build Project	Peter Green;Dave Thomson;Emil Tastula;Katelyn Preston;Leanne Plummer	29.6.2018.	27.9.2019.	Visok	Ne	<div><div style="width: 84%;">84%</div></div>	Izaberi
0015-10-2018	Thermal Monitoring - NTG	Administrator;Peter Green;Dave Thomson;Emil Tastula;Katelyn Preston	8.10.2018.	24.4.2020.	Visok	Ne	<div><div style="width: 67%;">67%</div></div>	Izaberi
0007-08-2019	GAM-A	Administrator;Peter Green;Katelyn Preston;Leanne Plummer	7.8.2019.	24.4.2020.	Visok	Ne	<div><div style="width: 77%;">77%</div></div>	Izaberi
0012-03-2020	Site Trial Projectos BAE Hunter and ArcelorMittal	Administrator;Garry Chapple;Katelyn Preston	9.3.2020.	17.9.2021.	Visok	Ne	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>	Izaberi
0018-03-2020	Satellite MAP	Administrator;Garry Chapple;Katelyn Preston	9.3.2020.	18.6.2020.	Visok	Ne	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>	Izaberi
0023-03-2020	PSM 825 Build	Garry Chapple;Emil Tastula;Katelyn Preston	23.3.2020.	24.6.2020.	Visok	Ne	<div><div style="width: 0%;">0%</div></div>	Izaberi

# Kendo Manager 3.6 – modul poruke



**KENDO manager** Sensei Dojo Projekat Izveštaji Poruke Obavještenja Search Administrator

**PORUKE:**

Sanduče ( 20 )  
Poslano ( 15 )  
Nacrt ( 1 )  
Obrisano ( 1 )

Novi Odgovori Odgovori svima Proslijedi Izbriši Označi sve kao pročitano

	Od	Naslov:	Datum	Mapa			
<input type="checkbox"/>	Ljubiša Vuković123456789	RE: poruka	28.4.2021 11.03.29	Inbox	↩	↪	🗑️
<input type="checkbox"/>	Ljubiša Vuković123456789	test	28.4.2021 07.40.40	Inbox	↩	↪	🗑️
<input type="checkbox"/>	Ljubiša Vuković123456789	mario	28.4.2021 00.57.01	Inbox	↩	↪	🗑️
<input type="checkbox"/>	Ljubiša Vuković123456789	test	25.4.2021 20.10.30	Inbox	↩	↪	🗑️
<input type="checkbox"/>	Lati	FW: Test poruke	24.4.2021 08.23.33	Inbox	↩	↪	🗑️

« ‹ 1 2 3 4 › » Broj rekorda po strani: 5 ▾ Strana 1 od 4, rekorda 1 do 5 od 20.



# Hvala na pažnji

[www.kendomanger.com](http://www.kendomanger.com)

Email: [office@kendomanager.com](mailto:office@kendomanager.com)
